UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE EDILIZIA APPALTI LAVORI

Ufficio Manutenzione pe	· la Sicurezza di Ateneo
-------------------------	--------------------------

LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE LAMPADE PER ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE USCITE DI SICUREZZA E VIE DI FUGA CON CONTROLLO DA CENTRALE E DA REMOTO PRESSO LE SEDI DI ATENEO IN CASERTA E PROVINCIA SEDI: CASERTA

Allegato: 7

Scala:

Data:

LUGLIO_2022

Tipologia:

PROGETTO

Titolo:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

GRUPPO DI LAVORO Progettisti

- Geom. Domenico Migliozzi

- P.E. Angelo Massaro

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP

- sig.ra Concetta Gagliardi Conulta fur liv COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Geom. Domenico Migliøzzi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Geom. Girolamo Liguori

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Cronoprogramma di **PROGETTO**

OGGETTO: Oggetto: Lavori per adeguamento normativo delle lampade di illuminazione e segnalazione uscite di sicurezza e vie di fuga con controllo da centrale e da remoto presso le sedi dell'Ateneo in Caserta e Provincia

Sedi: CASERTA

COMMITTENTE:

, 06/07/2022


Il Tecnico (Geom, D. Migliozzi)


4
-

ID	Nome attività	Durata	Importo	Luglio 2022 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	8 g	9′159,00	
2	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	8 g	9′443,00	
3	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	9 g	1′648,50	
4	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio	13 g	1′089,19	
5	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	1 g	1′225,08	
6	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425	1 g	95,68	
7	Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nu	3 g	724,90	
8	Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche	4 g	71′834,40	
9	Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	1 g	0,00	
10	Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	6 g	1′315,52	
11	Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	1 g	0,00	
12	Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nu	3 g	527,20	
13	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	6 g	25′935,00	
14	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	1 g	23′529,60	
15	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	9 g	3′593,73	
16	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio	1 g	4′027,47	
17	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	4 g	1′225,08	
18	Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche	22 g	82′355,60	
19	Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	1 g	2′631,04	
20	Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	6 g	494,70	
21	Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	6 g	0,00	
22	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425	6 g	95,68	
23	Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nu	20 g	1′383,90	
24	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	15 g	32′718,00	
25	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	9 g	31′734,00	
26	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	4 g	2′119,50	
27	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio	16 g	2′533,00	
28	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	8 g	2′450,16	
29	Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche	9 g	60′950,40	
30	Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	12 g	1′315,52	
31	Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	9 g	494,70	
32	Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	1 g	0,00	
	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin	7 g	95,68	


[]				Luglio 2022
ID	Nome attività	Durata	Importo	06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
34	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	9 g	29'925,00	
35	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	12 g	29'025,00	
36	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	10 g	1′177,50	
37	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio	7 g	2′533,00	
38	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	7 g	2′450,16	
39	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425	10 g	95,68	
40	Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nu	11 g	1′318,00	
41	Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche	1 g	108′840,00	
42	Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	6 g	2′631,04	
43	Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	18 g	494,70	
44	Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	21 g	0,00	
45	Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nu	12 g	1′014,86	
46	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	17 g	22′836,10	
47	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	13 g	18′382,50	
48	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	21 g	3′527,79	
49	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio	1 g	4′078,13	
50	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	16 g	3′981,51	
51	Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche	12 g	85′983,60	
52	Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	19 g	5′262,08	
53	Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	10 g	0,00	
54	Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	9 g	0,00	
55	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425	6 g	382,72	
56	Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nu	1 g	711,72	
57	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	1 g	13′965,00	
58	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	1 g	13′545,00	
59	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	1 g	942,00	
60	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio	1 g	1′266,50	
61	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	1 g	2′450,16	
62	Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche	1 g	33′377,60	
63	Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	1 g	1′315,52	
64	Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	1 g	494,70	
65	Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	1 g	0,00	
66	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425	1 g	95,68	
1				


ID	Nome attività	Durata	Importo	Luglio 2022 06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21
67	Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont	1 g	777,62	00070809101112131413161716192021
	i alimentazione per adeguamento alla posa a nu Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl			
68	regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	1 g	25′828,60	
69	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	1 g	25′051,80	
70	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	1 g	4′813,62	
71	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c	1 g	4′078,13	
	incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z	52,		
72	o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	1 g	1′837,62	
73	Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche	1 g	93′602,40	
74	Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control	1 g	2′631,04	
	uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un			-
75	uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	1 g	494,70	
76	Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	1 g	0,00	
77	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin	1 g	95,68	
78	e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425 Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont	1 g	369,04	
70	i alimentazione per adeguamento alla posa a nu Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl	1 9		
79	regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	1 g	22´290,80	
80	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	1 g	21'620,40	
81	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i	1 g	3′556,05	- · · ·
	controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c	 		-
82	incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio	1 g	3′723,51	_
83	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	1 g	1′531,35	
84	Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche	1 g	74′374,00	
85	Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control	1 g	2′631,04	
	uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un			
86	uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	1 g	494,70	_
87	Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	1 g	0,00	
88	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin	1 g	95,68	
	e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425		7249 000	
			1 200 000	
			1 100 000	
			1 000 000	
			900 000	
	— Previsione		800 000	
			700 000	
			600 000	
			500 000)-
			400 000	
			300 000	/ -
			200 000	<u>, </u>
			100 000	
			С	

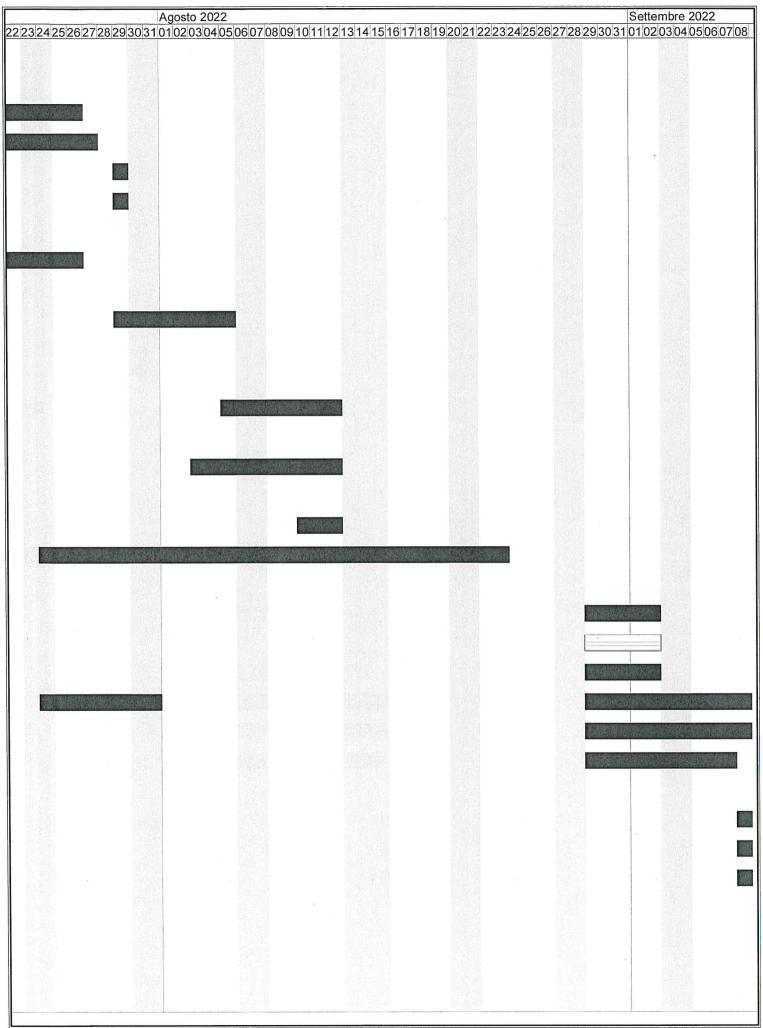

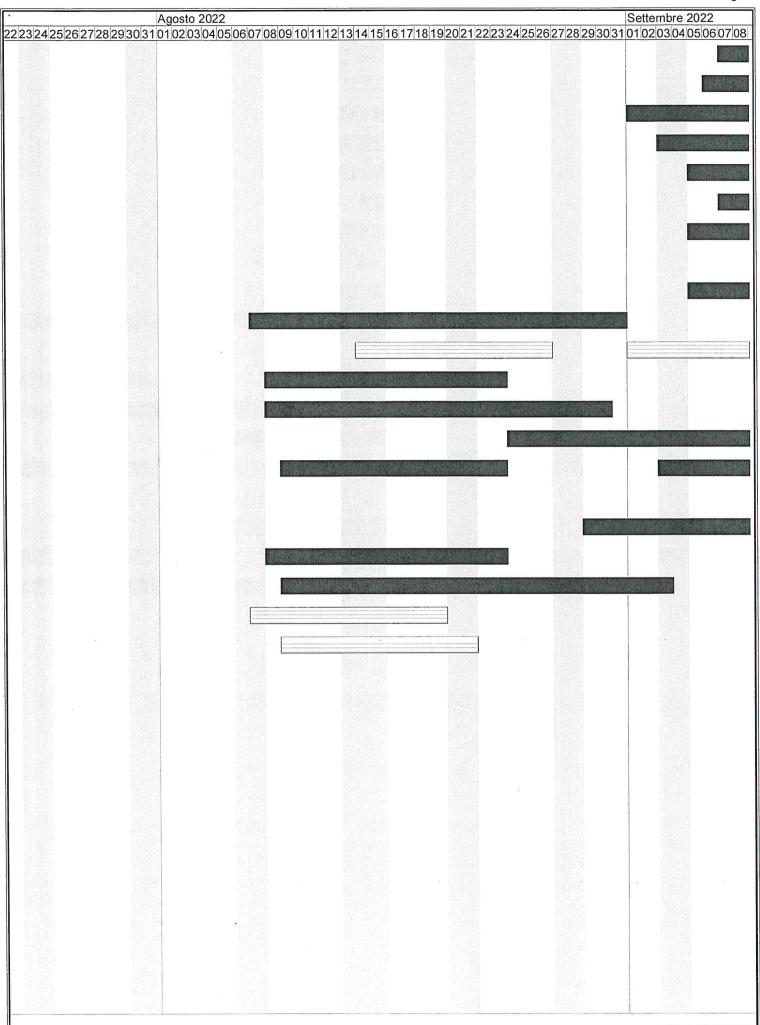

	Agosto 2022 101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2	Settembre 2022
22 23 24 25 26 27 28 29 30 3	101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2	6 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08
		(A)
		(A. 18)
400 miles		

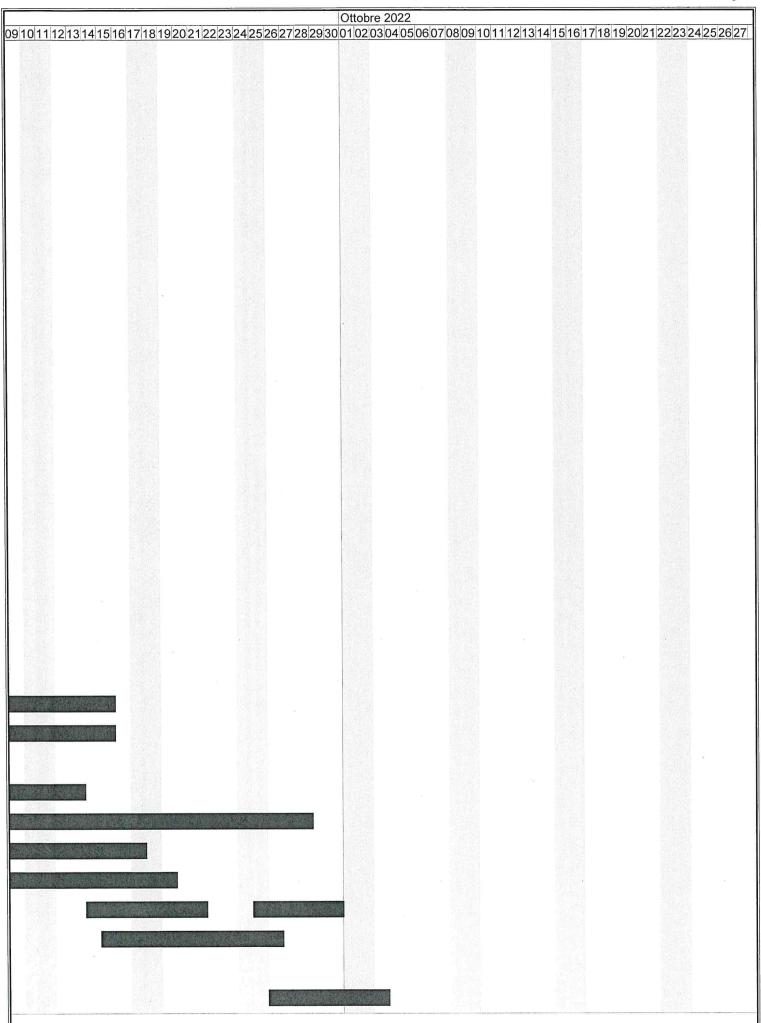

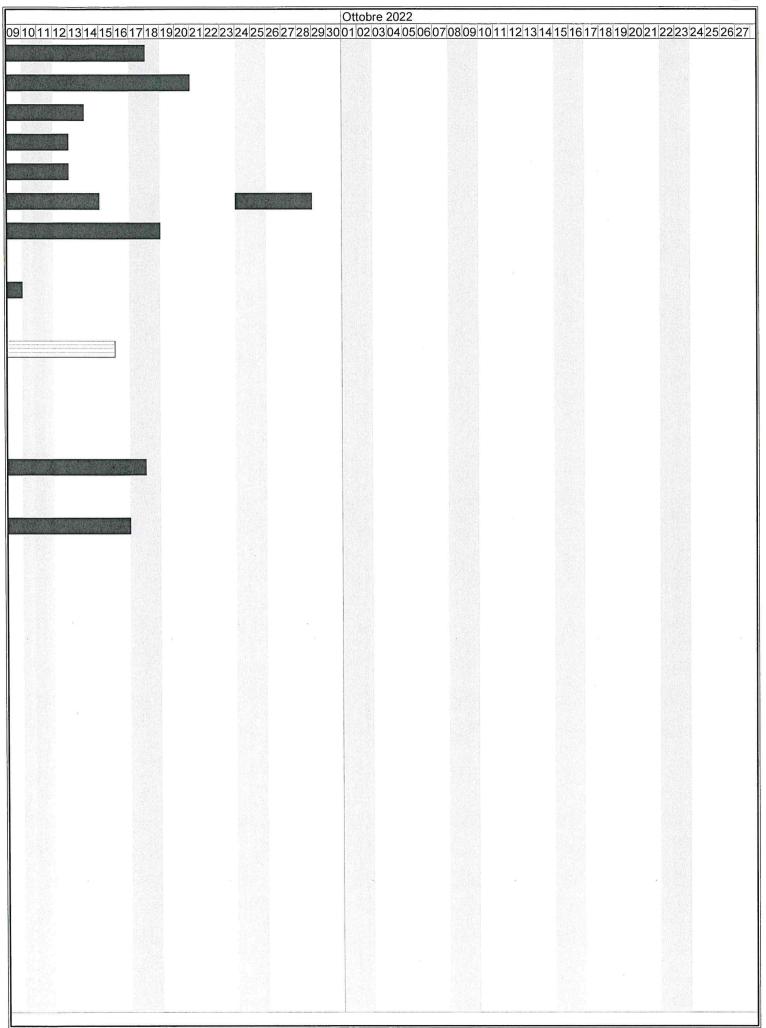

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3	Ottobre 2022		A	
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3	00102030405060	7 08 09 10 11 12 13 14	1 15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27
MARCHINE DE L'UNIONE DE L'UNIONE AND MARCHINE DE MARCHINE DE L'EXPERTANT DE L'EXPERTANT DE L'EXPERTANT DE L'EXPE			ore extrement, the extractions religion	TERRORANIA STATE MERSONS OF MIS

Università degli Studi della Campania

Tabella Attività

Luigi Vanvitelli

OGGETTO: Oggetto: Lavori per adeguamento normativo delle lampade di illuminazione e segnalazione uscite di sicurezza e vie di fuga con controllo da centrale e da remoto presso le sedi dell'Ateneo in Caserta e Provincia

Sedi: CASERTA

COMMITTENTE:

, 06/07/2022

Il Tecnico (Geom. D. Migliozzi)

PREVISTO					Pag.12	
ATTIVITA'	PREVISTO euro	(%)	Inizio	Fine	GIO Lav.	Tot.
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	9′159,00	0,865	06/07/2022	15/07/2022	8	10
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	9′443,00	0,892	06/07/2022	15/07/2022	8	10
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	1′648,50	0,156	14/07/2022	26/07/2022	9	13
Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm	1′089,19	0,103	11/07/2022	27/07/2022	13	17
Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	1′225,08	0,116	29/07/2022	29/07/2022	1	1
Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm	95,68	0,009	29/07/2022	29/07/2022	1	1
Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nuove lampade.	724,90	0,068	06/07/2022	08/07/2022	3	3
Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche da remoto.	71′834,40	6,785	21/07/2022	26/07/2022	4	6
Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	0,00	0,000	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	1′315,52	0,124	29/07/2022	05/08/2022	6	8
Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	0,00	0,000	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nuove lampade.	527,20	0,050	06/07/2022	08/07/2022	3	3
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	25′935,00	2,450	05/08/2022	12/08/2022	6	8
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	23′529,60	2,222	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm periodo 01 periodo 02	3′593,73 399,31	0,339 <i>0,038</i> <i>0,302</i>	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm	4′027,47	0,380	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A periodo 01 periodo 02	1°225,08 306,27	0,116 <i>0,0</i> 29 <i>0,087</i>	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche da remoto. periodo 01 periodo 02			06/07/2022	06/07/2022	1	1
Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	2′631,04	0,249	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da						

					ag.13		
ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIO	RNI
,,,,,,,		euro	(%)		, .	Lav.	Tot.
	eriodo 01 eriodo 02	494,70 84,10 410,60	0,047 0,008 0,039	06/07/2022 06/07/2022 29/08/2022	02/09/2022 06/07/2022 02/09/2022	6 1 5	6 1 5
	 eriodo 01 eriodo 02	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,000 0,000 0,000	06/07/2022 06/07/2022 29/08/2022	02/09/2022 06/07/2022 02/09/2022	6 1 5	6 1 5
	. e CEI, eriodo 01 eriodo 02	95,68 16,27 79,41	0,009 0,002 0,008		02/09/2022 06/07/2022 02/09/2022	1	6 1 5
p.		1´383,90 69,20 345,98 968,73	0,131 0,007 0,033 0,091	06/07/2022 06/07/2022 24/07/2022 29/08/2022	15/09/2022 06/07/2022 31/07/2022 15/09/2022	5	27 1 8 18
	jola d'arte eriodo 01 eriodo 02	32′718,00 2′181,20 30′536,80	3,090 0,206 2,884	06/07/2022	15/09/2022 06/07/2022 15/09/2022	1	1
	gola periodo 01 periodo 02	31 734,00 3 525,96 28 208,04	2,997 0,333 2,664	06/07/2022		1	1
	rosoffitti periodo 01 periodo 02	2´119,50 529,88 1´589,63	0,200 0,050 0,150	06/07/2022		1	6 1 5
1		2'533,00 158,31 2'374,69	0,239 0,015 0,224	06/07/2022	28/09/2022 06/07/2022 28/09/2022	1	1
	z o 250 V periodo 01 periodo 02	2´450,16 306,27	0,231 0,029 0,202	06/07/2022	06/07/2022	1	1
	O e per periodo 01 periodo 02		5,757 0,640 5,117	06/07/2022	19/09/2022 06/07/2022 19/09/2022	1	1
F	uiti da periodo 01 periodo 02 periodo 03	657,76	0,124 0,010 0,062 0,052	06/07/2022 14/09/2022		1 6	1 8
	uiti da periodo 01 periodo 02		0,047 0,005 0,042	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.		0,00	0,000	06/07/2022	06/07/2022	1	1

Pag.14						
ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Inizio Fine		RNI
ATTIVITA	euro	(%)	IIIIZIO	rille	Lav.	Tot.
Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm periodo 01 periodo 02	95,68 13,40 82,28	0,009 0,001 0,008	06/07/2022 06/07/2022 26/09/2022	03/10/2022 06/07/2022 03/10/2022		9 1 8
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline periodo 01 periodo 02	29 [°] 925,00 3 [°] 325,00 26 [°] 600,00	2,826 0,314 2,512	06/07/2022 06/07/2022 07/09/2022	17/09/2022 06/07/2022 17/09/2022	9 1 8	1
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline periodo 01 periodo 02	29°025,00 2°418,75 26°606,25	2,741 0,228 2,513			1	1
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm periodo 01 periodo 02	1′177,50 117,75 1′059,75	0,111 0,011 0,100	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm periodo 01 periodo 02		0,239 0,034 0,205	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A periodo 01 periodo 02	2´450,16 349,15	0,231 0,033 0,198	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm periodo 01 periodo 03	57,41	0,009 0,001 0,005 0,003	06/07/2022 07/09/2022	06/07/2022 14/09/2022	2 6	1 8
Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nuove lampade. periodo 02 periodo 02		0,124 0,011 0,113	06/07/2022	06/07/2022	2 1	1
Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche da remoto.	108′840,00	10,280	06/07/2022	06/07/2022	2 1	1
Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube periodo 02 periodo 02		0,249 0,041 0,208	06/07/2022	06/07/2022	2 1	1
Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube periodo 02 periodo 02		0,047 0,003 0,044	06/07/2022	06/07/2022	2 1	1 1
Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto. periodo 02 periodo 03	0,00	0,000	06/07/2022 14/08/2022	2 06/07/2022 2 26/08/2022	2 1	1 13
Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nuove lampade. periodo 00 periodo 00		0,096 0,008 0,088	06/07/2022	06/07/2022	2 1	1 1

Pa							
ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GļO	RNI
		euro	(%)			Lav.	Tot.
	gola d'arte periodo 01 periodo 02	22′836,10 1′343,30 21′492,80	2,157 0,127 2,030	06/07/2022 06/07/2022 08/08/2022	30/08/2022 06/07/2022 30/08/2022	1	24 1 23
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl re d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline		18′382,50 1′414,10 16′968,40	1,736 0,134 1,603			13 1	17 1
l ·	periodo 01 periodo 02 periodo 03	3′527,79 168,01 1′679,92 1′679,87	0,333 0,016 0,159 0,159	06/07/2022 06/07/2022 09/08/2022 03/09/2022	17/09/2022 06/07/2022 23/08/2022 17/09/2022	1 10	31 1 15 15
Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50		4′078,13	0,385	06/07/2022	06/07/2022	1	1
	z o 250 V periodo 01 periodo 02	3′981,51 248,08 3′733,43	0,376 0,023 0,353	06/07/2022 06/07/2022 29/08/2022	16/09/2022 06/07/2022 16/09/2022	1	1
	D e per periodo 01 periodo 02	85′983,60 7′165,30 78′818,30	8,121 0,677 7,444	06/07/2022	06/07/2022	1	17 1 16
	uiti da periodo 01 periodo 02	5´262,08 276,26 4´985,82	0,497 0,026 0,471		06/07/2022	1	1
	uiti da periodo 01 periodo 02	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000	06/07/2022	06/07/2022	1	1
		0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,000 0,000 0,000	06/07/2022	06/07/2022	1	1
	e CEI, periodo 01 periodo 02	382,72 64,11 318,61	0,036 0,006 0,030	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in con alimentazione per adeguamento alla posa a nuove lampad		711,72	0,067	06/07/2022	06/07/2022	. 1	1
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl re Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	egola d'arte	13′965,00	1,319	06/07/2022	06/07/2022	. 1	1
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl re d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	egola	13′545,00	1,279	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo i cor o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	ntrosoffitti	942,00	0,089	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con cincendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50		1′266,50	0,120	06/07/2022	06/07/2022	1	1

	PREVISTO					Pag.16 GIORNI		
ATTIVITA'	euro	(%)	Inizio	Fine	Lav.	Tot.		
Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	2′450,16	0,231	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche da remoto.	33′377,60	3,153	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	1′315,52	0,124	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	494,70	0,047	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	0,00	0,000	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm	95,68	0,009	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nuove lampade.	777,62	0,073	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	25′828,60	2,440	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	25′051,80	2,366	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	4′813,62	0,455	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm	4′078,13	0,385	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	1′837,62	0,174	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche da remoto.	93′602,40	8,841	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	2′631,04	0,249	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	494,70	0,047	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	0,00	0,000	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm	95,68	0,009	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Smontaggio plafoniera da parete oppure da incasso in cont i alimentazione per adeguamento alla posa a nuove lampade.	369,04	0,035	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline	22´290,80	2,105	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline	21 620,40	2,042	06/07/2022	06/07/2022	1	1		
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	3′556,05	0,336	06/07/2022	06/07/2022	1	1		

				Pag.17 GIORNI		
ATTIVITA'	PREVISTO	(%)	Inizio	Fine	GIO Lav.	RNI Tot.
Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm	3′723,51	0,352	06/07/2022	06/07/2022		101.
Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, c z o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	1′531,35	0,145	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Apparecchi per illuminazione di sicurezza con lampada LED e per individuazione della lampada guasta anche da remoto.	74′374,00	7,025	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Fornitura e posa in opera di modulo Exiway Smart Control uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	2´631,04	0,249	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo Control Un uiti da lampade di sicurezza, tipo Exiway SmartExit DiCube	494,70	0,047	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Fornitura e posa in opera di sistema Exiway Smart Control amento alla rete LAN locale per il collegamento da remoto.	0,00	0,000	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resin e CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm	95,68	0,009	06/07/2022	06/07/2022	1	1
Data, 06/07/2022						
Tecnico Geom. D. Migliozzi						

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Oggetto:

Oggetto: Lavori per adeguamento normativo delle lampade di illuminazione e segnalazione uscite di sicurezza e vie di fuga con controllo da centrale e da remoto presso le sedi dell'Ateneo in Caserta e Provincia

Sedi: CASERTA

COMMITTENTE:

06/07/2022

II Tecnico (Geom. D. Migliozzi)

	-		 	
		ĸ		
			*	

			Pag.19		
	IMPORTI PREVISTI				
DATA	Parziale euro	Progressivo euro	(%)		
06/07/2022	540′107,45	540′107,45	51,014		
07/07/2022	2′742,62	542'850,07	51,273		
08/07/2022	2'742,61	545′592,68	51,532		
11/07/2022	2'472,76	548'065,44	51,766		
12/07/2022	2'472,76	550′538,19	51,999		
13/07/2022	2′472,76	553'010,95	52,233		
14/07/2022	2'655,92	555'666,87	52,483		
15/07/2022	2'655,93	558′322,81	52,734		
18/07/2022	266,95	558′589,76	52,760		
19/07/2022	266,95	558'856,71	52,785		
20/07/2022	266,95	559′123,66	52,810		
21/07/2022	18′225,55	577′349,21	54,531		
22/07/2022	18'225,55	595′574,76	56,253		
25/07/2022	22'038,15	617′612,91	58,334		
26/07/2022 27/07/2022	22´038,15 3´896,38	639′651,06 643′547,44	60,416 60,784		
28/07/2022	3′812,60	647′360,04	61,144		
29/07/2022	5′352,61	652′712,66	61,650		
01/08/2022	3′962,66	656′675,31	62,024		
02/08/2022	3′962,66	660′637,97	62,398		
03/08/2022	4′361,96	664′999,93	62,810		
04/08/2022	4'361,96	669'361,89	63,222		
05/08/2022	8'684,46	678'046,35	64,042		
08/08/2022	17′085,73	695′132,08	65,656		
09/08/2022	17′530,71	712′662,79	67,312		
10/08/2022	17′836,98	730′499,77	68,997		
11/08/2022	17′836,98	748′336,75	70,681		
12/08/2022	17′836,98	766′173,73	72,366		
16/08/2022	12′808,91	778′982,64	73,576		
17/08/2022 18/08/2022	12′808,91 12′808,91	791´791,54 804´600,45	74,786 75,996		
19/08/2022	12′808,91	817′409,36	77,205		
22/08/2022	12'808,91	830'218,27	78,415		
23/08/2022	12′808,91	843′027,17	79,625		
24/08/2022	3'061,68	846'088,85	79,914		
25/08/2022	3'061,68	849'150,53	80,203		
26/08/2022	3'061,68	852'212,21	80,493		
29/08/2022	9′184,98		81,360		
30/08/2022	9′184,98	870′582,16	82,228		
31/08/2022	7′841,67	878′423,83	82,968		
01/09/2022	7′932,07	886′355,90	83,718		
02/09/2022	7′932,07	894′287,97	84,467		
05/09/2022 06/09/2022	8′996,28 11′415,03	903´284,25 914´699,28	85,316 86,395		
07/09/2022	14′749,60	929'448,88	87,788		
08/09/2022	18'460,28	947′909,16	89,531		
09/09/2022	17'576,13	965′485,29	91,191		
12/09/2022	17′136,75	982′622,03	92,810		
13/09/2022	16'424,74	999'046,78	94,361		
14/09/2022	15'886,74	1′014′933,52	95,862		
15/09/2022	15′932,21	1′030′865,73	97,367		
16/09/2022	13′681,82	1′044′547,54	98,659		
19/09/2022	9.′513,84	1′054′061,39	99,558		
20/09/2022	2′741,72	1′056′803,11	99,816		
21/09/2022	322,97	1′057′126,09	99,847		
22/09/2022 23/09/2022	213,35 213,35	1′057′339,44 1′057′552,78	99,867 99,887		
26/09/2022	213,35 347,14	1′057′552,78	99,887		
27/09/2022	292,10	1′058′192,02	99,920		
28/09/2022	292,10	1′058′484,12	99,975		
29/09/2022	124,22	1′058′608,34	99,987		
30/09/2022	124,21	1′058′732,55	99,999		
03/10/2022	13,71	1′058′746,26	100,000		

COMMITTENTE: TABELLA DATE ED IMPORTI

			Pag.20			
	DATA	Parziale euro	Progressivo (%)			
Data, 06/07/2022						
	Tecnico Geom. D. Migliozzi					
